

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Утверждено:

Директор МКУ «Управление городского хозяйства»

Р.В. Царев

« 11 » 08 2023 г.

(должность, Ф.И.О., подпись)

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Южское городское поселение Южского муниципального района Ивановской области.
2. Наименование инициативного проекта: «Устройство детской игровой площадки по адресу: г. Южа, ул. Советская, около МКД №16».
3. Проект предусматривает устройство детской игровой площадки с установкой игровых элементов и малых архитектурных форм.
4. Инициатор проекта: инициативная группа граждан ул. Советская г. Южа Южского городского поселения в количестве 13 человек.
5. Общая стоимость реализации инициативного проекта составляет 1 058 000,00 руб. Реализация проекта осуществляется на условиях софинансирования:
 - средства областного бюджета (85%) - 899 300,00 руб.;
 - средства местного бюджета (13%) - 137 540,00 руб.;
 - средства юридических лиц и (или) ИП (1%) - 10 580,00 руб.;
 - средств жителей ТОС (1%) - 10 580,00 руб.
6. Заказчиком в лице МКУ «Управление городского хозяйства» заключен муниципальный контракт с с ООО «21 ВЕК» г. Иваново на выполнение работ по устройству детской игровой площадки.
7. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 06.03.2023 по 31.08.2023.
8. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован 12.07.2023 года.
- 8.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: не нарушен.

8.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____ - _____.

9. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта - 70 человек. Количество граждан, принявших имущественное участие в реализации проекта – 305 человек.

10. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта: гражданами выполнялись работы по демонтажу металлического ограждения, по покосу травы на территории будущей детской игровой площадки, погрузка и вывоз скошенной растительности и демонтированных ограждений. Проведены субботники, сбор и вывоз строительного мусора с территории. Проведен общественный контроль за ходом реализации проекта.

11. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: отсутствуют.

12. В результате проведения аукциона по закупке товаров, работ и услуг образовалась экономия, софинансирование инициативного проекта составило:


Наименование мероприятия (проекта) ¹	Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования, руб.	В том числе, руб.			
		Объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование проекта	Средства Субсидии, предоставленной из областного бюджета в 2023 году	Объем инициативных платежей, руб. ²	
				Объем софинансирования за счет средств граждан, поддержавших проект	Объем инициативных платежей, кроме средств граждан, поддержавших проект (при наличии)
Расход на «Устройство детской игровой площадки по адресу: г. Южа, ул. Советская, около МКД №16»	809 370,00	105 218,10	687 964,50	8 093,70	8 093,70
Экономия составила	248 630,00	32 321,90	211 335,50	2 486,30	2 486,30

¹ Указывается мероприятие (направление) в рамках расходного обязательства муниципального образования Ивановской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии. Мероприятие соответствует по наименованию и содержанию проекту, прошедшему конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 13.03.2020 № 113-п.

² Объем инициативных платежей, составляющих не менее 1% от стоимости проекта

13. Фотоматериалы

Фотографии территории до реализации инициативного проекта

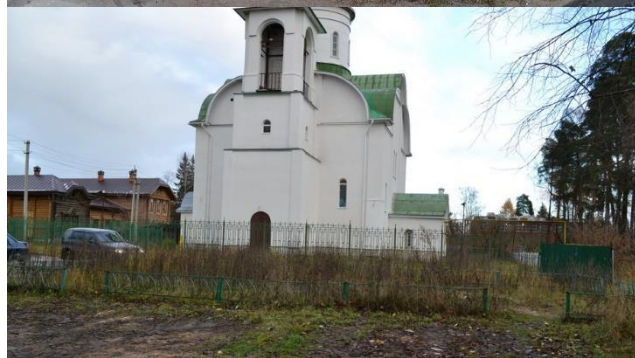

Фотографии территории после реализации инициативного проекта



14. Ссылки и скриншоты сайтов, отражающие:

- этапы строительства площадки;
- участие граждан и юридических лиц в реализации инициативного проекта;
- осуществление общественного контроля.

<https://t.me/admyuzha/4277>

https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11011

<https://ok.ru/yuzhaadm/topic/156378201279785>

<https://yuzha.ru/news/news10488.html>



Администрация Южного муниципального района ✓
31 мая в 11:46 · Госорганизация

📍 Депутаты Южного городского поселения совместно с жителями осуществляют общественный контроль за строительством детских игровых и спортивных площадок.

👍 В текущем году такие площадки появятся на пяти общественных территориях нашего города: ТОС «Дружный», ТОС «Исток», ТОС «Нефёдово» и в районе ул. Советская и Вокзальная.

В настоящее время, в рамках заключенного муниципального контракта, ведутся работы по установке детских игровых элементов.

Площадки появятся в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах, при поддержке губернатора. По инициативе Станислава Воскресенского финансирование программы поддержки идей активных жителей по преобразованию дворов и общественных пространств на этот год увеличили вдвое.

🔑 Также сообщаем, что данный контроль будет осуществляться на протяжении всей реализации проектов, до завершения строительства игровых площадок.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #ТОС #МестныеИнициативы

<https://t.me/admyuzha/4420>

<https://ok.ru/yuzhaadm/topic/156420644162857>

https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11156

<https://yuzha.ru/news/news10537.html>



Администрация Южного муниципального района ✓

14 июн в 13:30 · Госорганизация



Продолжается общественный контроль за строительством детских игровых и спортивных площадок.

В настоящее время, на трех детских игровых площадках города, выполнены работы по установке детских игровых элементов.

Напомним, в текущем году детские игровые и спортивные площадки появятся на пяти общественных территориях нашего города: ТОС «Дружный», ТОС «Исток», ТОС «Нефёдово» и в районе ул. Советская и Вокзальная.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #ТОС #МестныеИнициативы



20

<https://t.me/admyuzha/4533>

<https://yuzha.ru/news/news10567.html>

<https://ok.ru/yuzhaadm/topic/156460663917865>

https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11244



Администрация Южского муниципального района ✓

27 июн в 16:12 · Госорганизация



☀ Детству быть!

Сегодня, 27 июня, прошло торжественное открытие детских игровых площадок на улицах Советская и Вокзальная.

Игровые площадки были обустроены в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах, при поддержке губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский

📍 На мероприятии присутствовали первые лица района, депутаты районного и городского Советов, представитель подрядной организации - руководитель группы компаний «21ВЕК», директор МКУ «Управление городского хозяйства», а также жители – инициаторы проекта, и жители из соседних микрорайонов.

Глава района Владимир Оврашко поздравил всех участников и гостей торжества, а также вручил благодарственные письма за активное участие в создании и реализации проектов. Также скромные подарки были вручены представителям инициативных групп граждан, а всем детям мороженое от лица компании «21ВЕК». В свою очередь, представители инициативных групп граждан и мамочки с детьми высказали слова благодарности всем, кто принимал участие в реализации проектов.

🎉 Праздник принес много положительных эмоций и ярких впечатлений.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #ТОС #МестныеИнициативы #Открытие

